

INFORME MENSUAL



CORREDOR VIAL B

Mes: MAYO 2020

Contenido

1. Introducción	3
2. Cronograma actualizado de avance de obra.....	5
3. Avance físico ejecutado en cada Obra Principal	6
4. Avance físico global acumulado de las Obras Principales	7
5. Curva de ARAIS reconocidos al Contratista PPP.....	7

1. Introducción

El presente Informe se realiza para ser presentado en la Subsecretaría de Participación Pública Privada, y está referido al seguimiento de los Contratos PPP de los Corredores Viales A, B, C, E, F y SUR.

Datos Generales de Corredor:

- Nombre del Corredor: CORREDOR B 5
- Razón Social del Contratista PPP: CCA GREEN B S.A.
- Empresas integrantes del Contratista PPP: CCA - GREEN S.A.
- Fecha de Licitación: 24/04/2018
- Fecha de adjudicación: 13/06/2018
- Fecha de firma del Contrato: 26/07/2018
- Fecha de toma de posesión: 01/08/2018
- Monto Total TPI: U\$S 2.129.761.162,0



El CORREDOR VIAL NACIONAL B está integrado por los tramos de la Ruta Nacional detallado en el siguiente cuadro:

CV	RN N°	PK Inicial	PK Final	Desde	Hasta	Long (Km)
B	5	Eje Calle Pascual Simone	606,65	Eje Calle Pascual Simone – Luján	Empalme RN N°35 Santa Rosa	538,65
	5	65,00	73,00	Mojón kilométrico 65 Luján	Mojón kilométrico 73 Luján	8,00
	Longitud Total (Km)					546,65

2. Cronograma actualizado de avance de obra

Planificador de proyectos


Corredor: CV B



3. Avance físico ejecutado en cada Obra Principal

Se detalla el avance de obras del Corredor B.

CORREDOR VIAL B TRIMESTRE 7 - ABRIL 2020			
SECCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	TRAMO	AVANCE RECONOCIDO [%]
B-AU-02.1	Autopista Mercedes- Bragado	Mercedes - Inicio Variante Suipacha.	9,0652
B-RS-10	Obras de Repavimentación	Luján-Empalme RN N°35 Santa Rosa (La Pampa)	0,0400
B-RS-12.1	Estaciones de Cobro	Renovación: Olivera, 9 De Julio, Trenque Lauquén	1,1400
B-RS-13	Estaciones de Pesaje	1 (Una) Estación de Pesaje - Olivera	1,1401

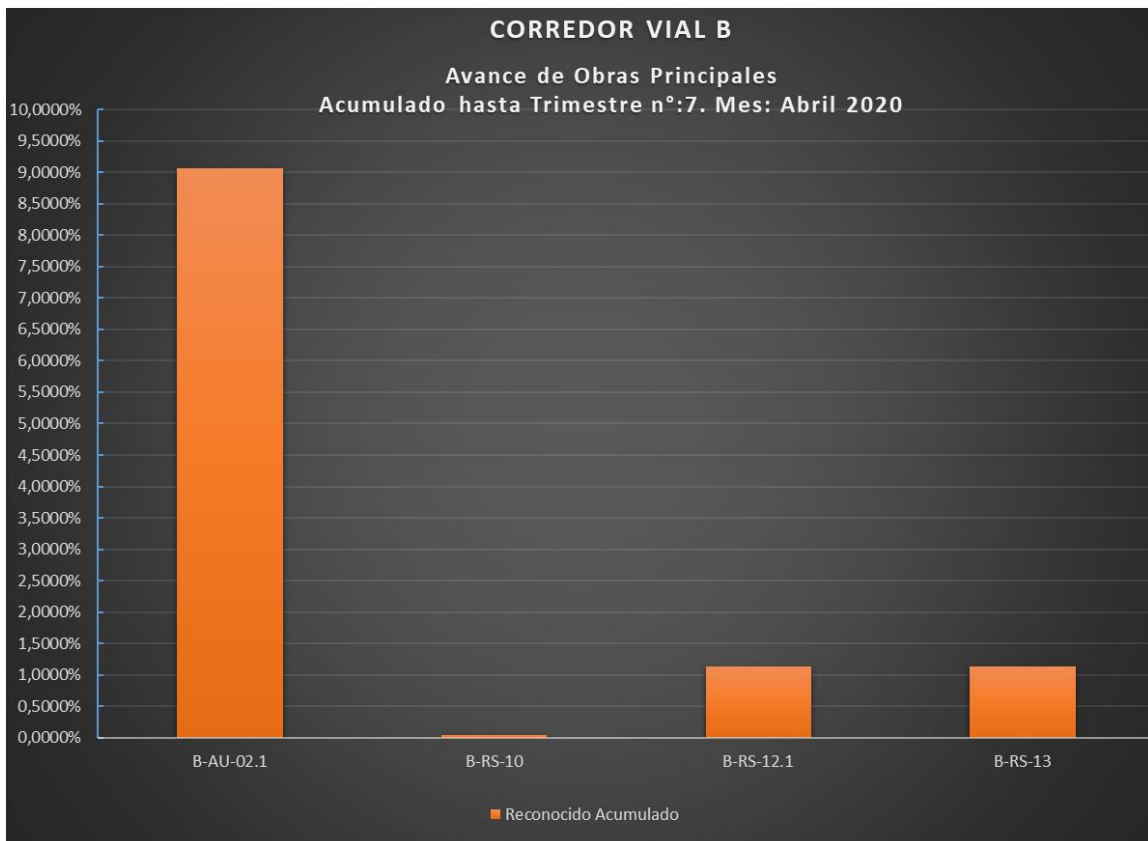

4. Avance físico global acumulado de las Obras Principales

	Avance reconocido [%]
Avance físico global acumulado del Corredor B al mes de Abril 2020 - Trimestre n° 7	0,7798

5. Curva de ARAIS reconocidos al Contratista PPP

El siguiente gráfico muestra los ARAIs reales acumulados desde el inicio del CONTRATO PPP.

CORREDOR VIAL B ARAI - Acumulado Emitido		
ARAI N°	MES	Acumulado Emitido [USD]
1	Agosto 2018	-
2	Septiembre 2018	-
3	Octubre 2018	-
4	Noviembre 2018	-
5	Diciembre 2018	274.739,19
6	Enero 2019	5.277.548,16
7	Febrero 2019	7.011.173,75
8	Marzo 2019	9.950.244,15
9	Abril 2019	10.887.339,06
10	Mayo 2019	12.393.080,20
11	Junio 2019	13.385.548,90
12	Julio 2019	14.263.010,50
13	Agosto 2019	15.677.171,91
14	Septiembre 2019	16.595.098,97
15	Octubre 2019	16.607.877,54
16	Noviembre 2019	16.607.877,54
17	Diciembre 2019	16.607.877,54
18	Enero 2020	16.607.877,54
19	Febrero 2020	16.607.877,54
20	Marzo 2020	16.607.877,54
21	Abril 2020	16.607.877,54

