


ACTA DE LA COMISIÓN ASESORA N° 352

Conforme con lo dispuesto por el Artículo 37 del Marco Regulatorio aprobado por Ley N° 26.221, a las 11hs. horas del 11 de mayo de 2023, se reunieron a través de la plataforma Zoom Meetings ID 93285783039 Código de acceso 412134, los integrantes de la Comisión Asesora en representación de:

Almirante Brown: Arq. Jorge GHILARDI; **Avellaneda:** Sra. Rocío MARTINEZ; **Esteban Echeverría:** Sr. Juan Carlos NÚÑEZ ARIAS, **Florencio Varela:** Sr. Darío LOPEZ; **Hurlingham:** Arq. Jorge Martínez; **Ituzaingó:** Arq. Romina AMPUGNANI; **José C. Paz:** Srta. Sofía AGUILERA;; **Lanús:** Ing. Federico OPICHANYJI; **Malvinas Argentinas:** Sra. Ludmila ROTELLA; **Merlo:** Sr. Humberto OLMEDO; **Moreno:** Sr. Alejandro DE PAULA; **Morón:** Arq. Patricia CALABRES; **Pilar:** Sr. Matías RILO, **Presidente Perón:** MMO. Gloria GOMEZ; **San Fernando:** Arq. Ivana BASCONCE; **San Martín** Arq. Mariana Rocío RODRIGUEZ; **Tres de Febrero:** Dra. Daiana DE ALMEIDA; **Vicente López:** Arq. Ana SCAGLIUSI; **Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:** Arq. Margarita BIGI; **Gobierno de la Provincia de Buenos Aires:** Sr. Adrián MERLO; **Agua y Saneamientos Argentinos (AySA):** el Sr. Gerente de Coordinación de Mejora y Mantenimiento, Ing. Fernando D. DOPAZO; Por la Agencia de Planificación: el Sr. Gerente de la Gerencia de Planificación Técnica y Económica, Ing. Alfredo GULLER, el Sr. Gerente de Coordinación de Nuevos Municipios, Lic. Leonardo PAGANONI y el Sr. Analista Superior de la Gerencia de Coordinación y Relaciones Institucionales, Lic. Jorge MORENO.

En mérito de lo fijado por el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Asesora aprobado por Resolución APLA N° 04/21 en el Art. 22 y sus alcances, la conducción de la Comisión Asesora, durante el período comprendido entre el 08/05/23 al 08/09/23, será responsabilidad del Municipio de Vicente López la Secretaría de Coordinación del Cuerpo y del Municipio de Escobar la Secretaría de Actas, con las obligaciones especificadas en los artículos 26 y 27 de dicho instrumento.

Se procedió a dar inicio a la reunión para la que fueron convocados según el Orden del



Día, en un todo de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 37 del Marco Regulatorio (Ley N° 26.221) que funcionará conforme así lo dispone la precitada norma, el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Asesora y aquellas que se dictaren al efecto de su funcionamiento.

ORDEN DEL DIA
REUNION DE COMISION ASESORA
11/MAYO/23

Temas:

A) ORGANIZACIONAL:

- 1.- Cambio de Autoridades
- 2.- Aprobación del Acta de la reunión anterior.
- 3.- Informe del Coordinador (Art. 29 de la Ley N° 26.221).
- 4.- Designación de dos miembros para la firma del Acta

B) OBRAS:

- 1.- 14º Ciclo de Reuniones Regionales de Habilitación de Obras: Región Oeste.

C) VARIOS:

1. Agenda Abierta.

Siendo las 11hs., se inicia la reunión verificándose que se cumple con el quórum para sesionar establecido en el artículo 13 del Reglamento de Funcionamiento aprobado mediante Resolución A.PLA N° 04/21.

A)1. El 08 de mayo de 2023 vencieron los mandatos del Secretario Coordinador y Secretario de Actas (tal como indica el Reglamento de Funcionamiento en sus Art. 24, 26, 27 y sus alcances); en tal sentido, se procede a formalizar el cambio de autoridades de la Comisión, correspondiéndole al Municipio de Escobar la Secretaría de Actas y al Municipio de Vicente López la Secretaría de Coordinación del Cuerpo.

A)2. Ante la ausencia de los Representantes de Escobar, se acuerda que será

reemplazado por el Representante del Municipio de Moreno en la Secretaría de Actas. Se procede a la lectura del Acta de la reunión próxima pasada, se aprueba y se firma.

A)3. Informe del Coordinador (Art. 29 de la Ley N° 26.221).

Se informa que se continúa con las reuniones preparatorias de la Revisión del Plan de Expansión y Mejoras para el quinquenio 2024-2028. Al respecto se informa que han llevado adelante el 55% de las reuniones y se tiene previsto finalizar con el total de las jurisdicciones en el transcurso de la tercera semana de mayo.

Toma la palabra el representante de AySA, Ing. Fernando DOPAZO para comentar que desde la concesionaria se valora positivamente este proceso, el desarrollo de las reuniones han sido muy positivo en cuanto a esta posibilidad de recibir una alimentación de información desde los municipios con respecto a la situación actual y a la priorización de sus necesidades, lo que ha resultado en algunos casos en la reformulación y recalibración de ciertos aspectos del Plan de Expansión en consolidación.

Finalizando el tema se recuerda que de cada reunión se están realizando minutas que reflejan los temas tratados, las priorizaciones solicitadas y los acuerdos alcanzados a fin de que estos temas se vean reflejados en el Plan de Expansión y Mejoras. Las mismas serán suscriptas por un representante de las jurisdicciones, un representante de AySA y un representante de APla.

- Designaciones:

- Municipio de Florencio Varela:


Titular: GUSTAVO EBERTO PAZ

Suplente: DARIO LOPEZ

Suplente: LAURA ABREU

Fecha: 27/04/2023

- Suspensión de derecho a voto por inasistencias (Art. 18 Reglamento de funcionamiento):



o Sancionados :

28 de abril al 28 de mayo: Tigre.

- Se remitió vía correo electrónico la presentación sobre "14º Ciclo de Reuniones Regionales de Habilitación y Estado de Obras: Región Norte.

A)4. Suscripción del Acta (Artículo N° 21 último ítem del Reglamento de funcionamiento).

Designados:

- Municipio de Presidente Perón
- Municipio de José C. Paz

B)1. 14º Ciclo de Reuniones Regionales de Habilitación de Obras: Región Oeste

- Realiza la exposición:
- *Viviana PEREYRA - DRO*
- *Juan José COLOMBO - DCySPMOEM*
- *Claudio CREMATA - DDC*
- *Fernando CORONEL - DRedes*
- *Ricardo NIÑO - DRedes*
- *Rafael LÓPEZ DE SANZO - DOCyEM*

REGIÓN OESTE

HURLINGHAM

COBERTURA DICIEMBRE 2021

AGUA POTABLE = 32,56%%

DESAGÜES CLOACALES = 70,89%

Agua potable

Handwritten signatures and initials on the left side of the page, including a large signature at the top, and smaller initials 'APR' and 'SFR' below it.

- 1 Obras Contratadas y en ejecución: \$447.426.195c/IVA. Habitantes: 4.638.

Obras de Mantenimiento y Operación (en curso):

- Se finalizó 1 obra de Agua Potable en 2022

AGUA POTABLE:

- En curso:
- RSA Hurlingham 1 Etapa 1 [Contratada último período]
- Finalizada:
- Puesta En Servicio Redes Primarias Impulsión Hurlingham Tesei (ES)

DESGÜES CLOACALES

- En Licitación:
- Obras especiales asociadas a C+T – Lote 1
- En curso:
- OBRAS DIPAC
- Finalizada:
- Ampliación Planta Depuradora Hurlingham (ES)
- C+T RSC Resto 2-3-7
- Habilitada:
- RSC Tramos faltantes Arroyo Morón
- RSC Roca M6

ITUZAINGÓ:

COBERTURA DICIEMBRE 2021

AGUA POTABLE = 20,54%

DESAGÜES CLOACALES = 38,03%

AGUA POTABLE:

Handwritten notes and signatures on the left side of the page. The notes include 'ART' and '8/12' written vertically. There are several large, stylized signatures or initials in black ink.

- 3 Obras Contratadas y en ejecución: \$447.426.195c/IVA. Habitantes: 4.386.
- 1 Obra en Licitación: \$1.071.505.869. Habitantes: 9.364.

DESGÜES CLOCALES:

- 2 Obras Contratadas y en ejecución: \$3.040.095.205. Habitantes: 8.174
- 2 Obras en Licitación: \$2.169.706.249. Habitantes: 2.597.

Obras de Mantenimiento y Operación (en curso):

- Se finalizaron 5 obras de Agua Potable en

AGUA POTABLE:

En Licitación:

- RSA Udaondo 2ª

En Curso:

- Centro de Mezcla 2 De Abril y Udaondo (Contratada ultimo período)
- A+T Regularización Redes Internas B° Villa Evita.
- A+T Regularización Redes Internas B° La Esperanza M1.

Habilitada:

- RPA Ituzaingó Etapa I
- RPA Ituzaingó Etapa II
- RSA Ituzaingó 2 Resto 1
- RSA Ituzaingó 3B
- RSA Ituzaingó 4B
- RSA Ituzaingó 4 A Resto I
- RSA Ituzaingó 4 A Resto II
- RSA Ituzaingó 4 A Resto III

DESGÜES CLOCALES:

En Licitación:

ADP
SFA
M

- RPC Colector Parque Leloir
- RSC Los Cardales

En Curso:

- RPC Colector Martín Rodríguez Etapa 2
- RPC Colector Martín Rodríguez Etapa 2 – Cuenca II

Habilitada:

- RSC Sector 1 a nuevo Colector Ituzaingó
- RSC Etapa 1 Resto
- RSC Ituzaingó Etapa 2 Inicial
- RSC Parque Leloir Cuenca 1 Zona Martín Fierro.

LA MATANZA:

COBERTURA DICIEMBRE 2021

AGUA POTABLE = 89,03%%

DESAGÜES CLOACALES = 59,08 %

AGUA POTABLE:

- 5 Obras Contratadas y en ejecución: \$4.639.621.146 . Habitantes: 47.998

DESGÜES CLOACALES:

- 3 Obras Contratadas y en ejecución: \$15.298.011.293. Habitantes: 2.815.

Obras de Mantenimiento y Operación (en curso):

- Desagües Cloacales: 4 obras

AGUA POTABLE:

En Licitación:

- Obras especiales asociadas a A+ T Lote 1.

Handwritten notes and signatures on the left side of the page, including the letters "APR" and "SFA" written vertically, and several illegible signatures.

En Curso:

- Bombeo de Salida Virrey del Pino.
- Rebombeo Rafael Castillo
- Renovaciones RSA San Justo RSA Ramos Mejía Etapa II- L a Matanza Norte y RSA Area de Influencia Vínculo Morón-Matanza.
- Instalación cañerías faltantes 2021-2023 Etapa 1 DR Oeste (Matanza N y S)

Finalizada:

- A+T RSA B° Coop. Madres del Pueblo-B°Marina, B°Las Casitas, B°Gral. San Martín, y B° Stella Maris.

Habilitada:

- RPA Alimentación B°El Trébol
- RPA Nexo Recolecta

DESGÜES CLOACALES:

En Licitación:

- Obras especiales asociadas a A+T Lote 1
- Instalación de cañerías faltantes 2021-2023 Etapa 2 Región Oeste

En Curso:

- Platan Depuradora Laferrere 150.000 habitantes
- C+T RSC Sarmiento Este M2
- C+T RSC Barrio Gral. San Martín (La Puñalada) [Contratada último período]

Finalizada:

- C+T RSC Parque Juan 1 Norte M 3, 4 y 5 (ES)
- C+T RSC Arco Iris Norte M 5 y 6
- C+T RSC Barrios Populares Etapa 1 – Arozena Tuyuti
- C+T RSC Sarmiento Este M1

Habilitada:

- RSC Parque Juan 1 Norte Módulo 3, 4 y 5
- RSC Parque Juan 2 Sudeste M1
- Renovación Parque Juan 2 Sudeste M1

ADO
RFA
[Handwritten signatures and marks]

- RSC Castillo 5 Noroeste M 3 y 4

MERLO:

COBERTURA DICIEMBRE 2021

AGUA POTABLE = 40,44%

DESAGÜES CLOACALES =24,09 %

AGUA POTABLE:

- 4 Obras Contratadas y en ejecución: \$1.221.467.685. Habitantes: 4.783
- 1 Obra en Licitación: \$208.759.924. Habitantes: 2.770

DESGÜES CLOACALES:

- 6 Obras Contratadas y en ejecución: \$187.085.413. Habitantes: 41.657

Obras de Mantenimiento y Operación (en curso):

- Agua Potable: 1 obra. Habitantes beneficiados: 300.

AGUA POTABLE:

En Licitación:

- RSA Barrio 4 Manzanas

En Curso:

- Obras Complementarias asociadas a Perforación en Hipopuelche en Estación de Rebombeo Merlo.
- CR Refuerzo Merlo
- RPA Interconexión de Pozos Región Oeste Etapa 1 [Contratada último período]
- RPA Interconexión de Pozos Pontevedra IV Etapa 1 [Contratada último período]
- RSA Pontevedra IV Zona 1 [Contratada último período].

Finalizada:

- RPA Refuerzo Merlo (ES) A+T RSA B° Malvinas Argentinas

Handwritten signatures and initials in the bottom left corner, including 'ADP', 'SFA', and several large, stylized signatures.

DESGÜES CLOACALES:

En Licitación:

- Instalación de cañerías faltantes 2021-2023 Etapa 2 Región Oeste

En Curso:

- C+T Relevamiento e Intervenciones Especiales en Redes Cloacales Existentes Parque San Martín Etapas 5, 6, 7, 8 y 9 [Contratadas último período]

Finalizada

- RSC Merlo Centro
- C+T Relevamiento e Intervenciones Especiales en Redes Cloacales Existentes Parque San Martín Etapas 1, 2 y 3.

MORENO:

COBERTURA DICIEMBRE 2021

AGUA POTABLE = 36,84%%%

DESGÜES CLOACALES = 29,80%

AGUA POTABLE:

- 2 Obras Contratadas y en ejecución: \$4.066.518.868
- 1 Obra en Licitación: \$996.842.120

DESGÜES CLOACALES:

- 3 Obras Contratadas y en ejecución: \$ 672.948.575. Habitantes: 6.877
- 1 Obra en Licitación: \$ 17.398.936.941

Obras de Mantenimiento y Operación (en curso):

- Se finalizaron en 2022, 2 obras de Agua potable y 1 de Desagües cloacales.

AGUA POTABLE:

En Licitación:

Handwritten signatures and initials in the bottom left corner, including 'APP', 'SD', and other illegible marks.

- Centro de Mezcla Moreno I

En Curso:

- RPA Interconexión de Pozos Región Oeste Etapa 1 [Contratada último período]
- Interconexión de Pozos Moreno 1 [Contratada último período]
- RPA Moreno 1 [Contratada último período]

DESGÜES CLOACALES:

En Licitación:

- Ampliación Planta Las Catonas – Primera Etapa
- Instalación de cañerías faltantes 2021-2023 Etapa 2
- Región Oeste Tareas y adecuaciones sobre EBC ejecutadas por DIPAC y Otros

En Curso:

- RPC Colector Las Catonas
- RPC Colector 25 De Mayo [Contratada último período]
- C+T Relevamiento e Intervenciones Especiales en Redes Existente Trujui Etapa 1 y 2

Habilitada:

- RSC San Cayetano 1

MORÓN:

COBERTURA DICIEMBRE 2021

AGUA POTABLE = 89,60 %


DESGÜES CLOACALES = 80,87%

AGUA POTABLE:

- 2 Obras Contratadas y en ejecución: \$41.950.891. Habitantes: 2.474.

Obras de Mantenimiento y Operación (en curso):

- Se finalizaron en 2022, 7 obras de Agua Potable y 7 de Desagües Cloacales.

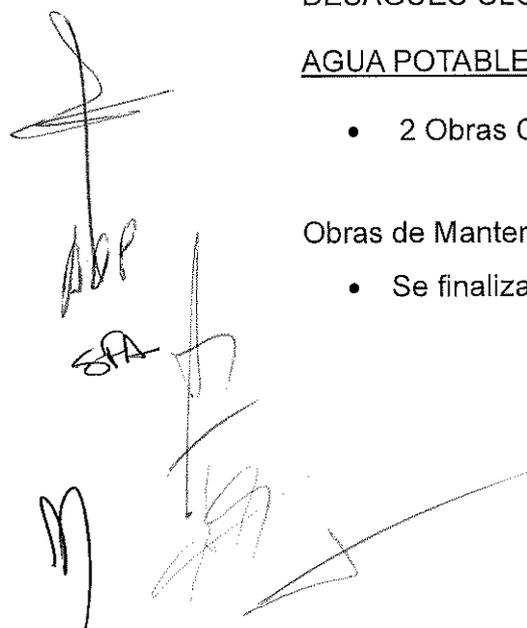

AGUA POTABLE:

En Licitación:

- Obras Especiales Asociadas a A+T Lote 1

En Curso:

- A+T RSA Resto Barrio Paz M 2
- A+T RSA Barrio Luz y Fuerza [Contratada último período]
- Instalación de cañerías faltantes 2021-2023 Etapa 1 DR Oeste

Finalizada:

- A+T RSA Resto Barrio Paz M1

Habilitada:

- RPA Merlo Gómez
- RSA Merlo Gómez

DESGÜES CLOACALES:

En Licitación.

- Instalación de cañerías faltantes 2021-2023 Etapa 2 Región Oeste

Habilitada:

- RPC Colector Morón Resto
- RSC Morón Resto 1
- RSC Morón Resto 2
- RSC Morón Resto 3
- RSC Morón Resto 4 R
- SC Morón Sur Resto Etapa II


TRES DE FEBRERO:

- COBERTURA DICIEMBRE 2021

AGUA POTABLE = 92,09%

DESGÜES CLOACALES = 89,43%

ADP
SFA

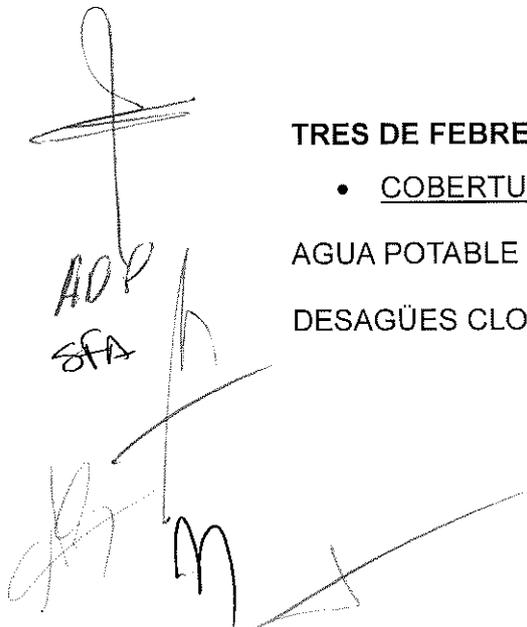

AGUA POTABLE:

- 3 Obras Contratadas y en ejecución: \$ 1.840.170.727. Habitantes:69.561

DESGÜES CLOACALES:

- 2 Obras Contratadas y en ejecución: \$55.498.654. Habitantes: 1.947
- 1 Obra en Licitación: \$161.852.937.

Obras de Mantenimiento y Operación (en curso):

- Agua Potable: 1 obra
- Desagües Cloacales: 1 obra

AGUA POTABLE:

En Curso:

- Renovación RSA Caseros 4 [Contratada último período]
- Renovación RSA Sectorización VR Caseros [Contratada último período]
- Instalación de cañerías faltantes 2021-2023 Etapa 1 –DR Oeste
- A+T Cierre de Malla Tres de Febrero M1 [Contratada último período]

Finalizada:

- Renovación RSA Caseros 2
- Renovación RSA Caseros 3

DESGÜES CLOACALES:

En Licitación:

- RPC Aliviador Caseros Centro
- Instalación de cañerías faltantes 2021-2023 Etapa 2 Región Oeste

En Curso:

- C+T RSC B° Loma Hermosa M2 [Contratada último período]
- C+T RSC Barrio Mercado [Contratada último período]

Finalizada:

APP
SFA
M
MAG

- RPC Aliviador Cloacal Villa Raffo
- RPC Aliviador Ejercito de Los Andes Etapa

PLANTA DEPURADORA LAFERRERE – OC70263 – Mayo 2023:

Características de las obras:

Alcance del Proyecto:

Obras de construcción y puesta en marcha del primer módulo de la Planta Depuradora Laferrere para el tratamiento del efluentes de una población equivalente a 150.000 habitantes e incluye obras, equipos e instalaciones complementarias para las ampliaciones futuras.

La Planta Depuradora Laferrere se construye en una fracción del terreno limitado por las calles sin nombre (paralela a Juan Manzanares), continuación de Edmundo D"Amici, continuación de Juan Bustos y el río Matanzas en la zona "Los Alamos" de la localidad de Virrey del Pino, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires. La superficie total del predio alcanza las 89 hectáreas.

La cuenca cloacal Laferrere comprende las localidades de G. Catán, Virrey del Pino, el sector oeste de R.Castillo y Laferrere, alcanzando un área de cobertura de aproximadamente 90 km².

El objetivo de la planta es tratar el líquido cloacal que ingresa a la misma y volcar el efluente tratado al Río Matanza, no superando los límites de 15mg/l en DBO5 y los 20 mg/l de MES en el 90% del tiempo. Para ello se efectuarán tratamientos tanto físicos como biológicos.

Está previsto que la planta vuelque los efluentes tratados en el río Matanza a través de un emisario.

La construcción de la Planta Depuradora Laferrere se realizará con las siguientes capacidades de tratamiento:

- Población equivalente: 150.000 habitantes
- Caudal promedio: 0,52 m³/s

ADP
SFA
M

- Concentración de DBO5 en el ingreso: 170 mg/l
- Concentración DBO5 en la descarga: menos de 15 mg/l
- Concentración de MES en la descarga: 20 mg/l.
- Dotación: 300 l/hab/d

Se han previsto como esquema básico del tratamiento:

- Desbaste pre y post bombeo con rejas gruesas y finas de limpieza automática.
- Estación de bombeo elevadora
- Desarenado – Desengrasado
- Decantación primaria en sedimentadores circulares
- Tratamiento biológico avanzado de barros activados, con incorporación de aire y agitación mecánica.
- Tratamiento terciario de eliminación de nutrientes (proceso MLE nitrificación desnitrificación)
- Clarificación (Decantación Secundaria)
- Tratamiento de barros, incluyendo espesamiento gravitatorio para barros primarios, flotación para barros biológicos, digestión anaeróbica mesófila y deshidratación de los lodos digeridos.
- Desinfección (a definir e instalar a futuro)
- Extracción, Transferencia y Tratamiento de Lodos.

Avances registrados – Abril 2023:

Se continúa las actividades excavación, carga y transporte de material excavado en el área de la fosa de gruesos.

Al mismo tiempo se continúa con el corte, doblado, armado y colocación de hierro estructural para columnas en edificio de taller y edificio de administración.

Se continúa con las actividades de perforación, colocación de armadura y vaciado de hormigón en los pilotes de clarificadores.

Se avanza con las actividades de excavación, colocación de armadura en el canal de by-pass.

Se continúa con la presentación de ingenierías.

Handwritten signatures and initials, including 'ADP' and 'SFA', are present on the left side of the page.

C) Agenda Abierta:

- **Solicitudes de información sobre estados de obra**

ITUZAINGÓ

-Solicita información sobre inclusión de los Desvinculados asociados a las obras de Expansión OA70145 y OA70146.

HURLINGHAM

-OA70209: Solicita información de estado y plazos de provisión de piezas especiales por parte de la Dirección de Grandes Conductos.

- **Información brindada por AySA en Agenda abierta:**


ALMIRANTE BROWN

Solicita información sobre programación de obras de Agua Potable y Desagües Cloacales en Barrio Roca

Agua Potable: SA70271 - RSA B° Los Paraguayos Resto B° Roca: La DDC informa que se han finalizado las obras en el Sector del Barrio Los Paraguayos. En el Sector de B° Roca, la obra no pudo continuarse con ejecución con Cooperativa de A+T producto de la existencia de interferencias eléctricas para las cuales la Empresa distribuidora de Energía no cuenta con planos conforme a obra. Se está trabajando en la generación de un nuevo proyecto y pliego para avanzar con la ejecución de esta obra con una empresa Contratista.

Desagües Cloacales: El Barrio Roca está circunscripto en el área del Proyecto SC70178 - RSC Corimayo Sur, su ejecución está asociada a la ampliación de la EBC Ramal Sur en Quilmes y todo su sistema de colectores primarios de transporte.


ADP
SFA
M

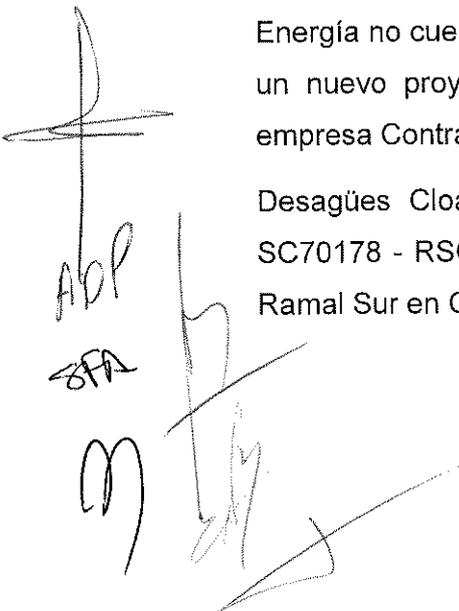


No habiendo otros temas, se procede a fijar como temas primarios para la próxima reunión a saber: 1) 14° Ciclo de Reuniones Regionales de Habilitación de Obras: Región Sudoeste. Siendo las 12:30 hs. se da por finalizada la jornada, quedando concertada la próxima reunión para el día 24 de mayo de 2023 a través de la plataforma Zoom Meetings ID 93285783039 Código de acceso 412134.




Secretario Coordinador
Municipio de Vicente López




Secretario de Actas
P/A Municipio de Moreno



Municipio de Presidente Perón




Municipio de José C. Paz

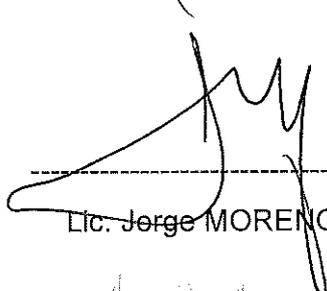


Lic. Jorge MORENO

Agencia de Planificación:

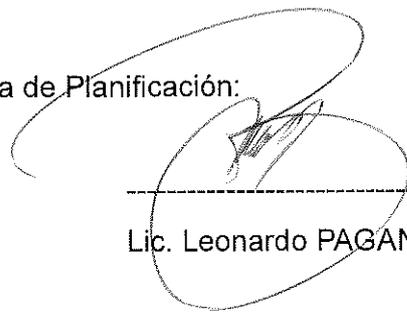

Lic. Leonardo PAGANONI



Ing. Alfredo GULLER
