



Vía Navegable Troncal

Informe de gestión

Octubre 2022



Administración
General de Puertos



Ministerio de Transporte
Argentina

Informe de gestión octubre: nuevos equipos para la VNT

La Administración General de Puertos, dependiente del Ministerio de Transporte, publicó el Informe Mensual de Gestión de la Vía Navegable Troncal correspondiente al mes de octubre, en el que se consolidó la adquisición de nuevos equipos como boyas, linternas y sensores multi paramétricos para seguir modernizando la infraestructura.

En el decimotercer mes de gestión pública, se realizaron diversas pruebas y avances en el Sistema de Monitoreo (SiMon), recientemente inaugurado. Además de la publicación de las imágenes tomadas por las cámaras instaladas, se avanzó en la instalación de las boyas multi paramétricas y sus sensores, que medirán diversos aspectos climáticos y de condiciones del río. En ese sentido, se profundizó el equipamiento de los restantes Puntos Remotos de Monitoreo, próximos a ser habilitados por esta administración.

Junto a los avances del SiMon, la Administración General de Puertos recibió además equipos adquiridos para seguir la tarea de modernización de la infraestructura disponible. Entre otros elementos, se entregaron nuevas boyas –más modernas y eficientes– y linternas –con nuevos sensores– que seguirán siendo distribuidas a lo largo de toda la traza para ofrecer un mejor servicio a la navegación.

Asimismo, si bien no corresponde estructuralmente al mes de octubre, días atrás la AGP llevó adelante el proceso participativo de audiencia pública en torno de la modificación de la tarifa del peaje en el tramo Santa Fe - Confluencia.

A nivel infraestructura, se completaron diversas mejoras encaradas en puntos neurálgicos de la traza, para garantizar una navegabilidad segura, más ágil y eficiente.

Durante octubre la Administración General de Puertos realizó el dragado de 753.656 m³ efectivos; se realizaron 368 intervenciones de mantenimiento de boyas, balizas y spars, normalizando 123 señales.

Informe de tráfico

Octubre 2022



350 buques durante el mes de octubre

Tráfico

Granelero	52%
Tanque	25%
Contenedor	14%
Carga general	5%
Vehículos	3%
Remolcador	1%
Frigorífico	0%
LNG tanker	0%
Suministro	0%
Tolva	0%
Wood chips carrier	0%
Pasajeros	0%

52%

Granelero

25%

Tanque

14%

Contenedor



5%

Carga general

3%

Vehículos


1%

Remolcador

*No pagan peaje

Distribución de los buques entrados a la VNT

Del 01/10/2022 al 31/10/2022

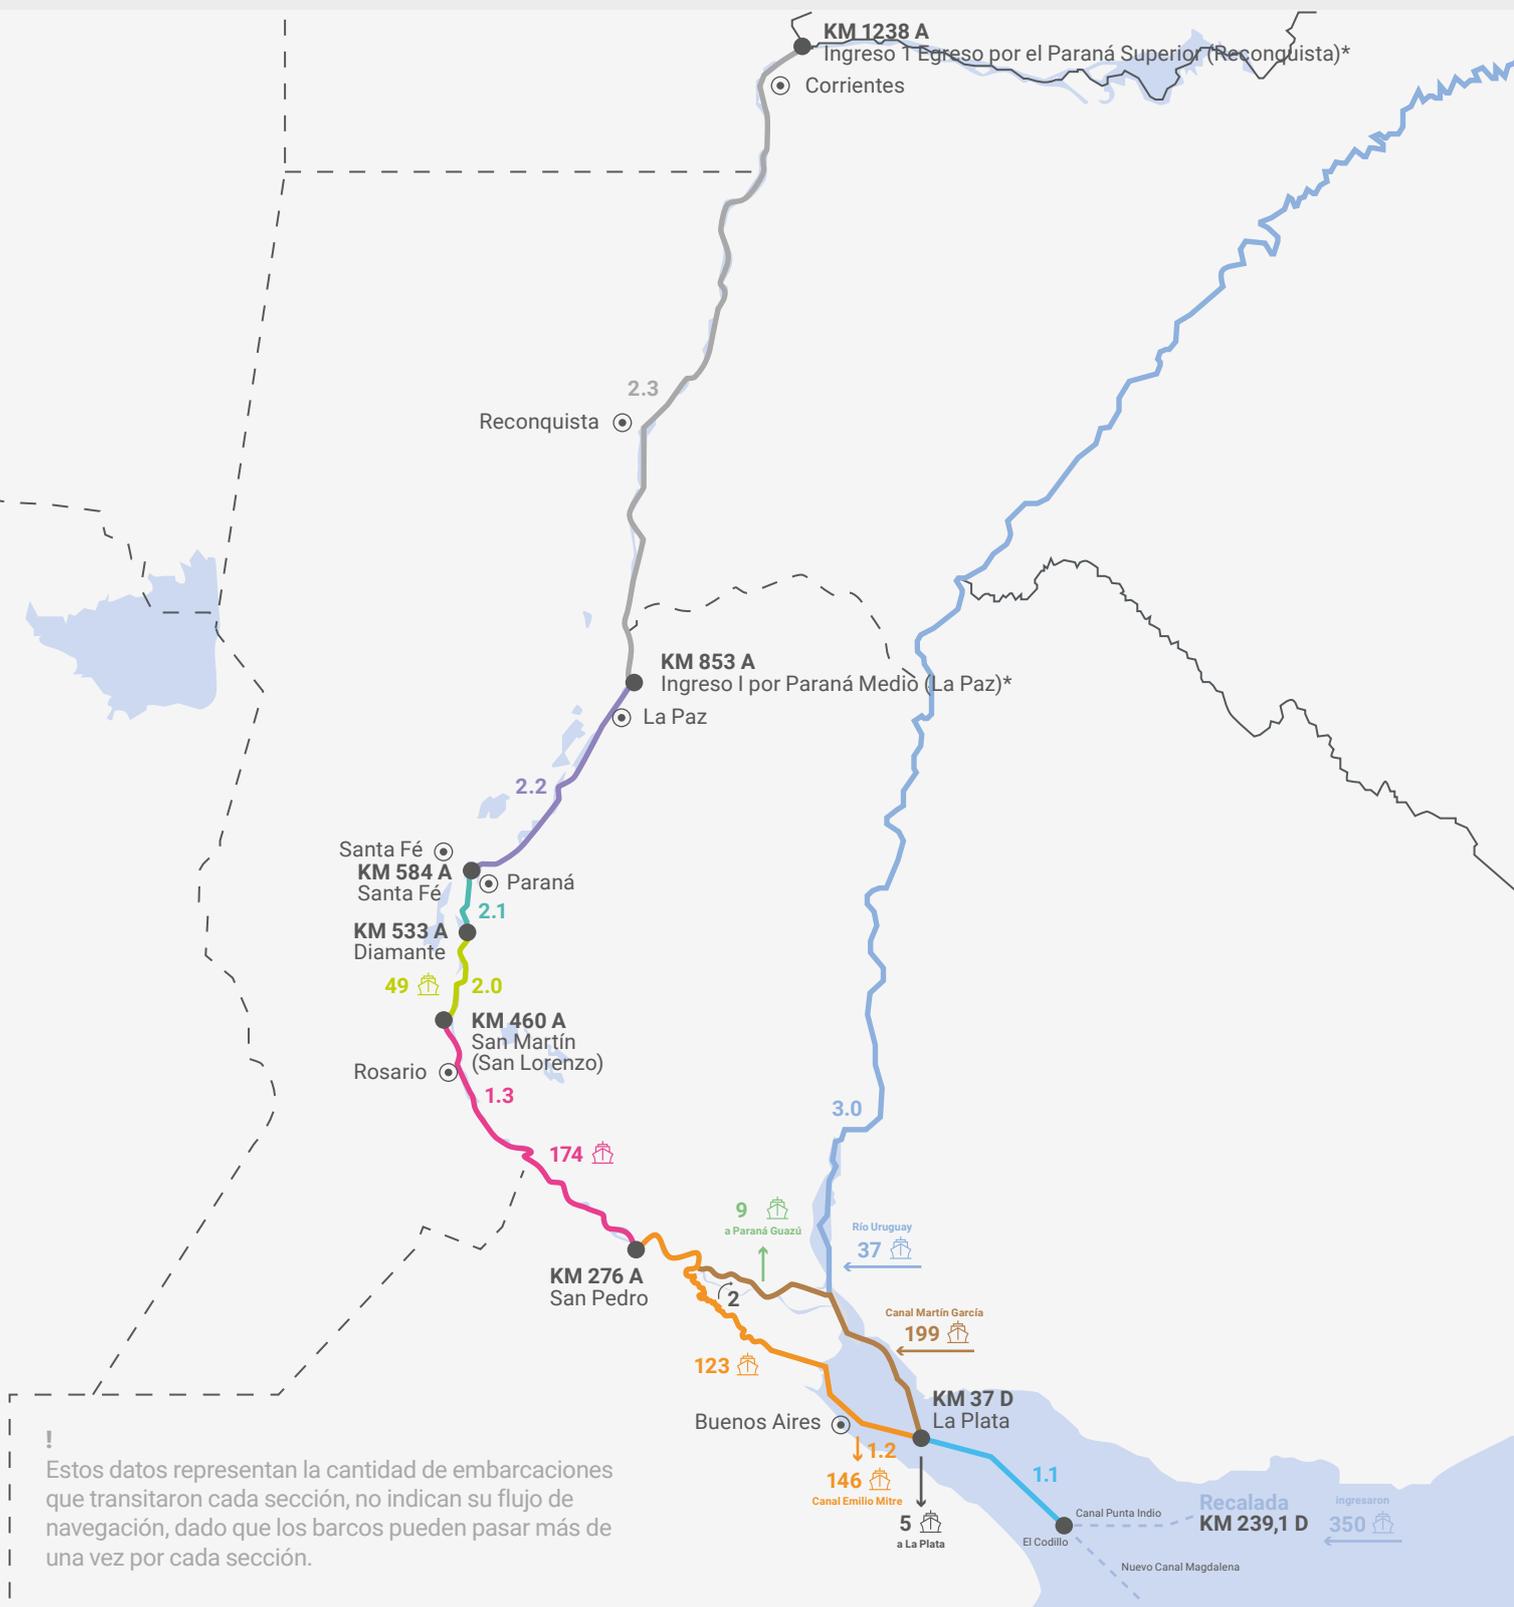

Informe económico

Ingresos y gastos devengados (en millones de USD)
Octubre 2022

Ingresos	16.721.700
Costos totales	11.130.353
Costos directos	9.192.645
Dragado	5.329.919
Señalización y balizamiento (incluye insumos)	3.132.138
Gastos de capital	346.142
Gastos operativos, administrativos y otros	529.618
Costos indirectos*	519.063
Impuestos y finanzas**	1.418.645
Neto resultante	5.591.348

* Remuneraciones, cargas sociales, reparación y mantenimiento, servicios básicos, gastos indirectos varios.

** Pago de impuestos e ingreso de saldo de inversiones (incluye Impuesto a las Ganancias).

Nota: los gastos devengados mensuales incluyen las certificaciones mensuales de servicios efectuados por los proveedores, y las estimaciones presupuestadas por esta AGPSE en caso de no haber sido presentadas al cierre del presente informe.

● ● ● Dragado



752.656 m³

dragados en
octubre 2022

Río de la Plata

Punta Indio

m³ efectivos

124.748

Paraná Inferior

Abajo Alvear

159.459

Alvear

28.973

Canal de los Muelles

34.177

Borghi

32.508

Borghi-Bella Vista

9.295

Bella Vista

111.496

Dragas utilizadas

Draga TSHD Capitán Núñez

Mantenimiento: el 01/10

Las Hermanas Brazo derecho: del 01/10 al 18/10 y el 26/10

Borghi: del 18/10 al 24/10

Canal de los Muelles: el 25/10 y del 27/10 al 31/10

La presente draga es propiedad del Estado Nacional y fue cedida para uso durante la concesión en los términos establecidos en los contratos correspondientes.

Draga WID Henri Pitot

A disposición: del 01/10 al 04/10 y el 06/10

Desmovilizada Temporarily: el 05/10

Mantenimiento: 07/10 al 31/10

Draga TSHD Alfonso de Albuquerque:

A disposición: el 01/10

Abajo Los Ratones Brazo Derecho: del 01/10 al 03/10 y del 10/10 al 16/10

Desmovilizada Temporarily: del 04/10 al 09/10 y el 26/10

Bella Vista: del 16/10 al 19/10 y del 23/10 al 25/10, el 27/10 y del 30/10 al 31/10

Mantenimiento: 20/10 al 22/10

Desmovilizada Temporarily: el 26/10

E. Borghi-Bella Vista: del 28/10 al 29/10

Draga TSHD Alvar Núñez Cabeça De Vaca

Desmovilizada Temporarily: del 01/10 al 31/10

Draga WID Giovanni Venturi

Mantenimiento: del 01/10 al 04/10

Abajo Los Ratones Brazo Derecho: del 05/10 al 06/10

A disposición: del 06/10 al 12/10 y el 26/10

Canal Punta Indio: del 13/10 al 31/10

Draga TSHD Ortelius:

Desmovilizada Temporarily: del 01/10 al 23/10 y del 27/10 al 31/10

Punta Indio: del 24/10 al 25/10

Draga TSHD Taccola:

Alvear: del 01/10 al 04/10 y del 06/10 al 12/10

A disposición: el 05/10

Abajo Alvear: del 13/10 al 24/10

Mantenimiento: el 25/10 y del 27/10 al 31/10

Draga WID Pancho

Mantenimiento: del 01/10, del 07/10 al 09/10 y el 22/10

A disposición: del 02/10 al 04/10, del 10/10 al 25/10 y del 27/10 al 30/10

Desmovilizada Temporarily: el 06/10 y el 26/10

Abajo Alvear-Alvear: del 30/10 al 31/10

Balizamiento



368 intervenciones
en señales

123 señales
normalizadas

Intervenciones	Cantidad
Verificaciones	84
Limpieza	51
Cambios Batería	6
Cambios Linterna	25
Cambios Cables	1
Vandalismo/ Robos	9
Rescate y Reinstalación	10
Reposición fondeo Cuerpo Muerto	2
Reposición Fondeo Completo	4
Pintura de boya	27
Reposición / Cambio Completo Señal	8
Cambio Parcial Torre	15
Cambio Parcial Casco	5
Cambio Parcial Marca Tope	21
Cambio / Ajuste destello	27
Carteles / Leyendas	26
Reubicación	10
Retiro de camalotes	30
Desmalezamiento del entorno	7

Control hidrológico

Todas las estaciones del proyecto de ampliación de la red hidrometeorológica aguas arriba del tramo de la VNT, concesionado a esta Administración, se encuentran publicadas en la página web y funcionando con regularidad:

 www.argentina.gob.ar/transporte/administracion-general-puertos-se/via-navegable-troncal/hidrometros

Como es habitual, se realizó el mantenimiento y calibración de las estaciones hidrometeorológicas existentes a lo largo de todo el mes para su correcto funcionamiento.

Monitoreo y gestión de la Vía Navegable Troncal

Los Puntos Remotos de Monitoreo de la VNT, están equipados con sistemas de identificación automática (AIS), para conocer la identificación, rumbo y velocidad de los buques que se detectan a lo largo del canal; radares, para discriminar los buques que emiten su identificación y aquellos que se los detecta como blancos sin identificación; cámaras de doble espectro, para visualizar en cualquier condición de luz o climática, los buques que navegan en torno al punto de control; y estaciones meteorológicas equipadas con torres y antenas.

La información obtenida de estos sitios remotos se encuentra publicada en la página web de la AGP:

Cámaras de vigilancia

 www.argentina.gob.ar/transporte/administracion-general-puertos-se/via-navegable-troncal/camaras-de-vigilancia

Estaciones meteorológicas

 www.argentina.gob.ar/transporte/administracion-general-puertos-se/via-navegable-troncal/estaciones-meteorologicas

Servicio de información AIS

 www.argentina.gob.ar/transporte/administracion-general-puertos-se/via-navegable-troncal/servicio-de-informacion-ais

Señalización

Puerto

Corrientes
Bella Vista
Zárate
Santa Fe
Rosario
Esquina
Dársena E (Bs. As)
Zárate
La Paz
Dársena E (Bs. As)
Zárate
Corrientes
Zárate
Goya
San Pedro
Esquina
La Plata
Santa Fe
La Paz
Dársena E (Bs. As)
Dársena E (Bs. As)
Rosario
Dársena E (Bs. As)
Dársena E (Bs. As)
La Plata
Dársena E (Bs. As)

Embarcación

Lancha Don Osvaldo
Lancha Don Osvaldo
Lancha Don Roberto
GC-77 "Golfo San Matías"
GC-190
Lancha Don Osvaldo
GC-79 "Río Deseado"
Lancha Don Roberto
Lancha Don Osvaldo
GC-73 "Cabo Corrientes"
Lancha Kawai
Lancha Don Osvaldo
Lancha Don Roberto
Lancha Don Osvaldo
Lancha Don Roberto
Lancha Don Osvaldo
GC-75 "Bahía Blanca"
GC-77 "Golfo San Matías"
Lancha Don Osvaldo
GC-75 "Bahía Blanca"
GC-73 "Cabo Corrientes"
GC-190
GC-75 "Bahía Blanca"
GC-73 "Cabo Corrientes"
GC-75 "Bahía Blanca"
GC-79 "Río Deseado"

Fecha

03/10/2022
04/10/2022
04/10/2022
04/10/2022
05/10/2022
05/10/2022
06/10/2022
06/10/2022
06/10/2022
12/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
19/10/2022
19/10/2022
20/10/2022
20/10/2022
20/10/2022
25/10/2022
21/10/2022
25/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
27/10/2022
27/10/2022
28/10/2022

Relevamientos batimétricos

Tarea	Embarcación	Fecha
TAREA	EMBARCACION	01/10/22
IN	DN75	01/10/22
IN	DN85	01/10/22
OUT	DN55	03/10/22
RT	HORNERITO	03/10/22
RT	HORNERITO	03/10/22
RC	DN75	04/10/22
RT	HORNERITO	05/10/22
RC	CEIBO	06/10/22
RC	CEIBO	07/10/22
BS	HORNERITO	10/10/22
RC	CEIBO	11/10/22
RC	CEIBO	12/10/22
RC	CEIBO	12/10/22
RC	DN60	12/10/22
RC	DN60	13/10/22
RC	DN85	13/10/22
RC	DN85	14/10/22
OUT	HORNERITO	16/10/22
IN	HORNERITO	15/10/22
IN	HORNERITO	16/10/22
IN	HORNERITO	16/10/22
IN	HORNERITO	17/10/22
IN	HORNERITO	18/10/22
IN	HORNERITO	18/10/22
IN	HORNERITO	18/10/22
OUT	DN85	19/10/22
OUT	DN60	19/10/22
RC	CEIBO	19/10/22
IN	HORNERITO	19/10/22
IN	HORNERITO	24/10/22
ZE	CEIBO	24/10/22
ZE	CEIBO	25/10/22
ZE	CEIBO	26/10/22

Relevamientos batimétricos

Tarea	Embarcación	Fecha
RC	HORNERITO	26/10/2022
RC	HORNERITO	26/10/2022
RC	HORNERITO	26/10/2022
RC	HORNERITO	27/10/2022
ZA	CHARRUA	28/10/2022
RC	HORNERITO	28/10/2022
ZA	CHARRUA	29/10/2022
OUT	HORNERITO	29/10/2022
ZA	CHARRUA	29/10/2022
RC	CEIBO	29/10/2022
RC	CEIBO	31/10/2022
OUT	HORNERITO	31/10/2022
RC	DN67	

Patrimonio y procedimientos de contratación

Patrimonio

- Recepción del Acta Definitiva de entrega de los bienes afectados a la concesión (artículo 1.1.2.1 del Contrato) - Draga Capitán Núñez 256-C
- Recepción del Acta de entrega de los bienes afectados a la obra de dragado de la VNT - Draga Capitán Núñez 256-C
- Recepción del Acta Definitiva de entrega de los bienes afectados a la concesión (artículo 1.1.2.1 del Contrato) - Balizador 573-B
- Recepción del Acta de entrega de los bienes afectados a la obra de mantenimiento de Boyas, Balizas y Spars en la VNT - (artículo 1.1.2.1 del Contrato) - Balizador 573-B
- Recepción del Acta Definitiva de entrega de los bienes afectados a la concesión (artículo 1.1.2.1 del Contrato) - Balizador 574-B
- Recepción del Acta de entrega de los bienes afectados a la obra de mantenimiento de Boyas, Balizas y Spars en la VNT - (artículo 1.1.2.1 del Contrato) - Balizador 574-B
- Recepción del Acta Definitiva de entrega de los bienes afectados a la concesión (artículo 1.1.2.1 del Contrato) - Buque Remolcador de empuje 294-B ("Mulita")
- Recepción del Acta de entrega de los bienes afectados a la obra de mantenimiento de Boyas, Balizas y Spars en la VNT - (artículo 1.1.2.1 del Contrato) - Mulita 294-B
- Recepción del Acta de entrega Definitiva - Mareógrafos e Hidrómetros compuestos por escalas hidrométricas
- En el mes se ha terminado el trámite del traspaso de las líneas telefónicas utilizadas para la transferencia de datos de las estaciones mareográficas a nombre de AGPSE, para la unidad de negocio VNT.
- Se ha recibido el Acta Definitiva de entrega de bienes afectados a la concesión (artículo 1.1.2.1 del contrato celebrado entre el Ministerio de Transporte de la Nación en representación del Estado Nacional y la AGPSE. El mismo fue firmado el día 03/12/2021. EX-2021-118426160- -APN-MEG#AGP
- El día 07/12/21 se abrieron los pliegos de la licitación de Renovación e incorporación de Elementos Informáticos, EX-2021-83667798-APN-MEG#AGP. Las ofertas recibidas están siendo evaluadas por la Gerencia de Sistemas, Tecnología y Organización para que análisis (al 28/12/2021).
- Se ha solicitado información sobre variaciones en el inventario inicial y potenciales compras de bienes destinados a la unidad de negocios VNT.
- Respecto del inventario inicial (Actas Definitivas de entrega de bienes afectados a la concesión) no se registran variaciones.
- Respecto de las adquisiciones, no hay registradas compra de bienes a la fecha.

Procedimientos de contratación

A. Licitación Privada N°08/2021 “Adquisición de Cuerpos Muertos de Hormigón para la VNT”: La Gerencia de Compras y Contrataciones celebró el acto de apertura de ofertas el día 18 de noviembre a las 11.00 hs, recibiendo las ofertas dos (2) ofertas:

- Oferta N°1: Pentamar S.A.
- Oferta N°2: Estilo Quarzo S.R.L.

Adjudicada. Órdenes de compra emitidas a Pentamar S.A. (renglón N°1) y Estilo Quarzo S.R.L (renglones 2 y 3). Entregas parciales en término.

B. Licitación Privada N°09/2021 “Adquisición de 4 camionetas tipo pick up para la Vía Navegable Troncal”: La Gerencia de Compras y Contrataciones Celebró el acto de apertura de ofertas el día 3 de noviembre de 2021, recibiendo una única oferta:

- Oferta N°1: Espasa S.A.

Adjudicada. Contrato con Espasa S.A. cumplido

C. Licitación Pública de Etapa Múltiple N°13/2021 “Dragado de Mantenimiento de la Vía Navegable Troncal”: La Gerencia de Compras en conjunto con otras dependencias de esta Administración gestionó y contestó presentaciones hechas por oferentes en el marco de su competencia, y propició la visita de obra y certificados de visita de 16 firmas de mercado. Se llevó a cabo la apertura de sobres N°1 (oferta técnica). Se recibieron sobres de las firmas:

1. UT Dredging International NV Suc. Arg. – Dredging International Argentina S.A. – CCCC Shanghai Dredging Co. Suc Arg. – Servimagnus S.A. Unión Transitoria.
2. Compañía Sudamericana de Dragados S.A.
3. Rohde Nielsen A/S Suc. Argentina – EMEPA S.A. – Unión Transitoria
4. Boskalis International B.V. Sucursal Argentina

La licitación en trato fue dejada sin efecto por Resolución N°RESOL-2022-38-APN-AGP#MTR

D. Licitación Pública N°14/2021 “Provisión de Boyas para la Vía Navegable Troncal”: La Gerencia de Compras y Contrataciones celebró el acto de apertura el día 30 de noviembre de 2021, recibiendo 5 ofertas:

- Oferta N°1: Construcciones y Proyectos Naval Tec S.A.
- Oferta N°2: Atonsys de Angeli Martín Gustav
- Oferta N°3: METANAV S.R.L.
- Oferta N°4: Ingeniería Matheu S.A
- Oferta N°5: Astillero Tecnao S.R.L.

Adjudicada a Ingeniería Matheu S.A. OC en ejecución. Entregas parciales en término.

E. Licitación Pública N°17/2021 “Provisión de Linternas Integradas para la Vía Navegable Troncal”: La Gerencia de Compras y Contrataciones celebró el acto de apertura el día 23 de noviembre de 2021, recibiendo 2 (dos) ofertas:

- Oferta N°1: Crux Marine – Sade Electromecanica UT (en formación)
- Oferta N°2: Dragados y Balizamientos S.A. Oferta alternativa N°1

Adjudicada a Crux Marine – Sade Electromecanica UT (en formación). En ejecución. (Bienes no entregados, aun en plazo de entrega)

F. Licitación Pública N°18/2021 “Provisión de Conjuntos de Fondeos para la Vía Navegable Troncal”: La Gerencia de Compras y Contrataciones celebró el acto de apertura el día 29 de noviembre de 2021, recibiendo una única oferta:

- Oferta N°1: Sade Electromecánica S.A.

Licitación declarada fracasada por única oferta inadmisibles. Actualmente se sustancia un procedimiento de compulsas abreviadas (Compulsas N°4/2022).

Compulsas Abreviadas N°04-2022 (devenida de la Licitación Pública N°18/2021): Se recibió la oferta de la firma INGENIERÍA MATHEU S.A. La compulsas fue declarada fracasada por oferta inadmisibles.

G. Licitación Pública N°22/2021 “Mantenimiento de boyas, balizas y spars de la Vía Navegable Troncal”: Se celebró el acto de apertura de ofertas el día 28/12/2021. Se obtuvieron 2 (dos) ofertas, correspondientes a las firmas:

- Oferta N°1: PENTAMAR S.A. – SADE ELECTROMECAÁNICA S.A. (UT)
- Oferta N°2: EMEPA S.A.

La licitación se encuentra Adjudicada a la firma EMEPA S.A. Todavía no comenzó la ejecución de la OC. Plazo reglamentario para la suscripción del Acta de Inicio.

H. Licitación Privada 05/2022 “Servicio de traslado en Lanchas VNT” Se celebró la apertura con fecha 18 de abril de 2022. Se obtuvieron tres ofertas, correspondientes a las firmas:

- Oferta N°1: BoatingServ S.A.
- Oferta N°2: Sade Electromecanica S.A.
- Oferta N°3: JORGE L. REBAGLIATI E HIJOS S.R.L.

La licitación se encuentra adjudicada a la firma BoatingServ S.A. Se encuentra actualmente en ejecución.

I. Contrataciones Directas

• Contrato N°06-AGPSE-2021 “Dragado de Mantenimiento de la Vía Navegable Troncal”, con la firma COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE DRAGADOS S.A. – En ejecución. Prorrogada por RESOL-2022-10-APN-AGP#MTR y RESOL-2022-48-APN-AGP#MTR. Actualmente se encuentran certificados 8.659.515 m3.

• Contrato N°07-AGPSE-2021 “Mantenimiento de la red hidrometeorológica de la VNT”, con la firma AMERICAN CONSULTING GROUP S.A. – En ejecución. Cumplimiento mensual.

• Contrato N°08-AGPSE-2021 “Mantenimiento de boyas, balizas y spars de la VNT”, con la firma EMEPA S.A. – En ejecución. Cumplimiento mensual. (prorrogada por RESOL-2022-21-APN-AGP#MTR). Finaliza con el comienzo de la ejecución de la licitación pública 22/2021.



Administración
General de Puertos



Ministerio de Transporte
Argentina
