G.C.B.A. ViADUCTO GENERAL BELGRANO SUR

Id	Nombre de tarea	Duración
1	**PE Tramo D. Taborda - Est. Constitución**	**572 días**
2	**Etapa 2 Tramo D. Taborda - Prog. 1+580**	**345 días**
3	Inicio tareas	1 día
4	**Proyecto constructivo**	**155 días**
5	Ingeniería de detalle. Estudios ambientales	155 días
6	Tareas de campo complementarias.	75 días
7	**Trabajos preliminares. Obrador. Viigla**	**320 días**
8	Obrador, depósitos, replanteo y nivelación. Equipamiento para	149 días
9	Vigilancia, mantenimiento de tránsito, prestaciones, vallado de seguridad	320 días
10	**Demoliciones**	**310 días**
11	Demolición manzana calle Ramón Carrillo y Brandsen	290 días
12	Edificios existentes; rotura y remoción de PAN y pavimentos; retiro de	200 días
13	Retiro de vías existentes	130 días
14	Retiro de Barreras Automáticas	120 días
15	Retiro y relocalización vías Sector Ferrosur Roca y Est. Sola	120 días
16	**Trazado ferroviario**	**185 días**
17	**Vías en viaducto**	**185 días**
18	Provisión e instalación de infraestructura de vías	180 días
19	Provisión y colocación de balasto de piedra y levantes de vías	180 días
20	Terminado mecanizado de vías	155 días
21	Provisión e instalación de aparatos de vías	60 días
22	**Estructuras**	**305 días**
23	**Viaducto**	**275 días**
24	Fabricación vigas premoldeadas postesadas	235 días
25	Fundaciones: pilotes	200 días
26	Hormigón de limpieza; cabezales, columnas, dinteles, estribos y tablero de hormigón in situ	210 días
27	Montaje de vigas premoldeadas , carpeta de cemento y colocación de apoyos de neopreno	230 días
28	Puentes metálicos	190 días
29	**Estación elevada Buenos Aires**	**270 días**
30	**Andenes**	**270 días**
31	Pilotes	80 días
32	Hormigón de limpieza, cabezales, columnas, dinteles, tablero Bs As	180 días
33	Estructura metálica (fabricación y montaje) Bs As	180 días
34	Edificio Accesos: estructura	100 días
35	Señalamiento ferroviario	80 días
36	Instalación Eléctrica para iluminación y fuerza motriz	100 días
37	Relocalización de interferencias	210 días
38	**Obras de Arquitectura**	**165 días**
39	Estación elevada Buenos Aires	165 días
40	Elementos complementarios de viaducto	100 días
41		
42		
43	**Etapa 3 Tramo Prog. 1+580 - Estación Constitución**	**227 días**
44	**Trabajos preliminares. Obrador. Viiglancia.**	**227 días**
45	Vigilancia . Mantenimiento de tránsito. Prestaciones. Vallado de seguridad.	227 días
46	**Demoliciones**	**100 días**
47	Retiro de vías existentes	60 días
48	Estribo existente en Puente Ituzaingó	70 días
49	Demolición parcial andenes Est. Constitución	45 días
50	**Trazado ferroviario**	**85 días**
51	Provisión e instalación de infraestructura de vi	80 días
52	Provisión y colocación de balasto de piedras y levante de vías.	80 días
53	Terminado mecanizado de vías	80 días
54	Provisión e instalación de aparatos de vías	40 días
55	**Estructura**	**178 días**
56	**Viaducto**	**178 días**
57	Fabricación vigas premoldeadas postesadas	48 días
58	Fundaciones: pilotes	40 días
59	Hormigón de limpieza, Cabezales, Columnas, Dinteles y Tableros de hormigón	60 días
60	Montaje de vigas premoldadas postesadas	60 días
61	Intervención Puente ituzaingó	85 días
62	Puentes metálicos	70 días
63	**Estación Constitución**	**60 días**
64	Andenes	50 días
65	Edificio Acceso estructura	45 días
66	Señalamiento ferroviario	70 días
67	Instalación eléctrica para iluminación y fuerza motriz	60 días
68	**Obras de Arquitectura**	**83 días**
69	Estación Constitución	83 días
70	Elementos complementarios de viaducto	30 días

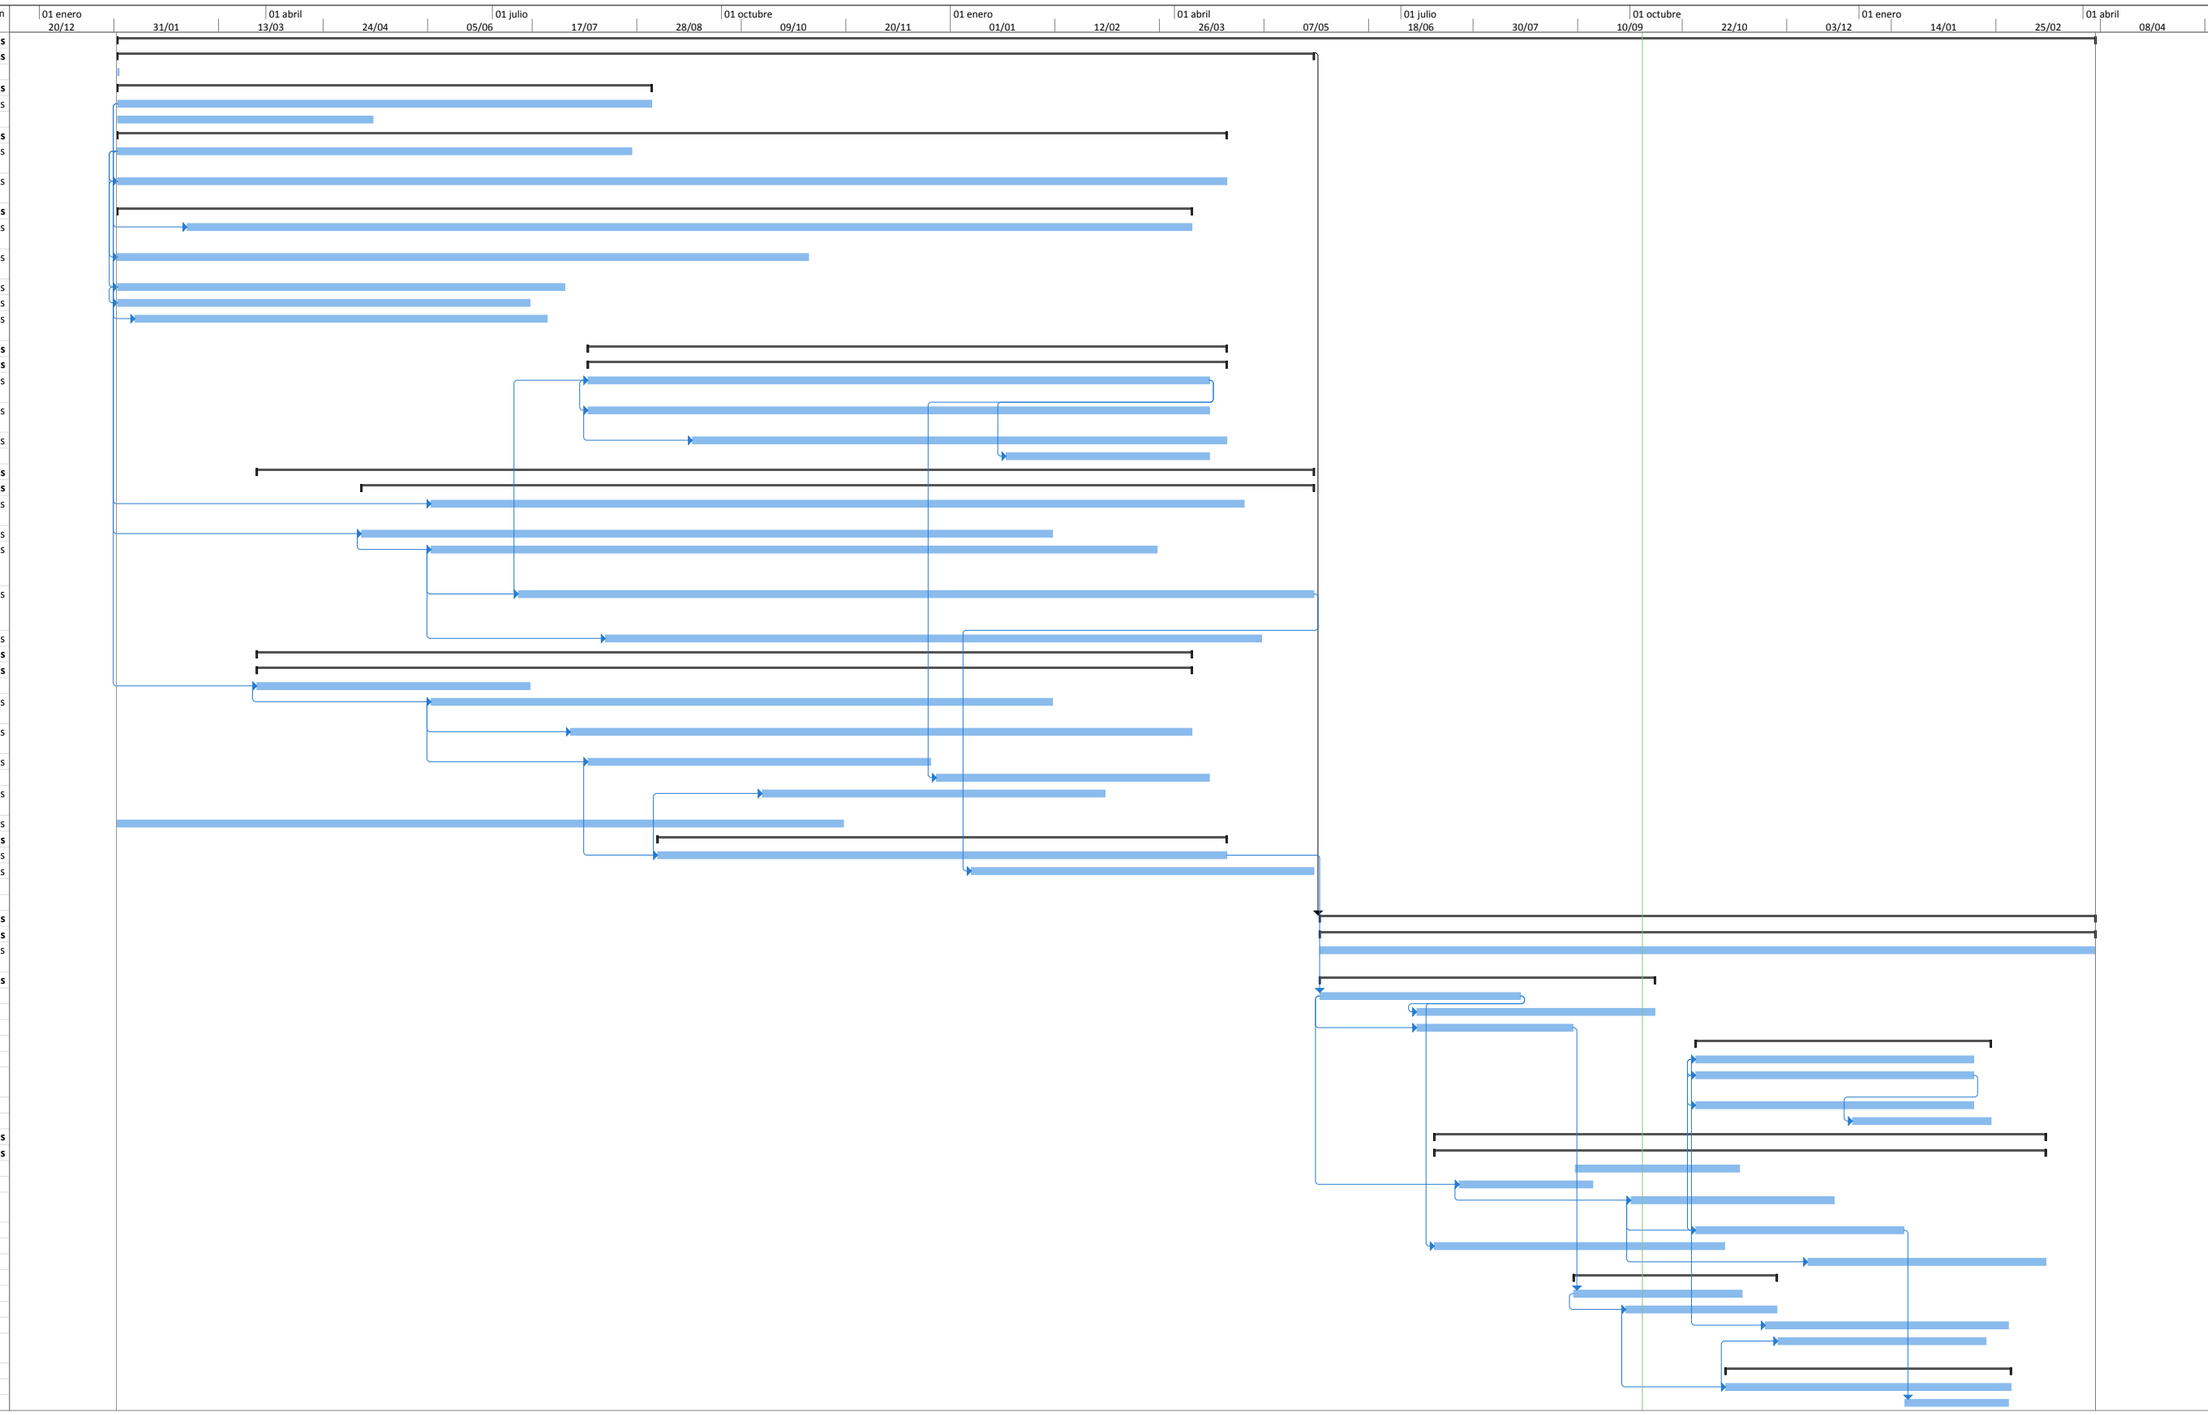

Proyecto: P E Viaducto Belgrano S
Fecha: vie 06/10/17

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito externo · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · Sólo el comienzo · Fecha límite · Progreso manual
División · Resumen · Tareas externas · Tarea inactiva · Resumen inactivo · Sólo duración · Resumen manual · Sólo fin · Progreso
